


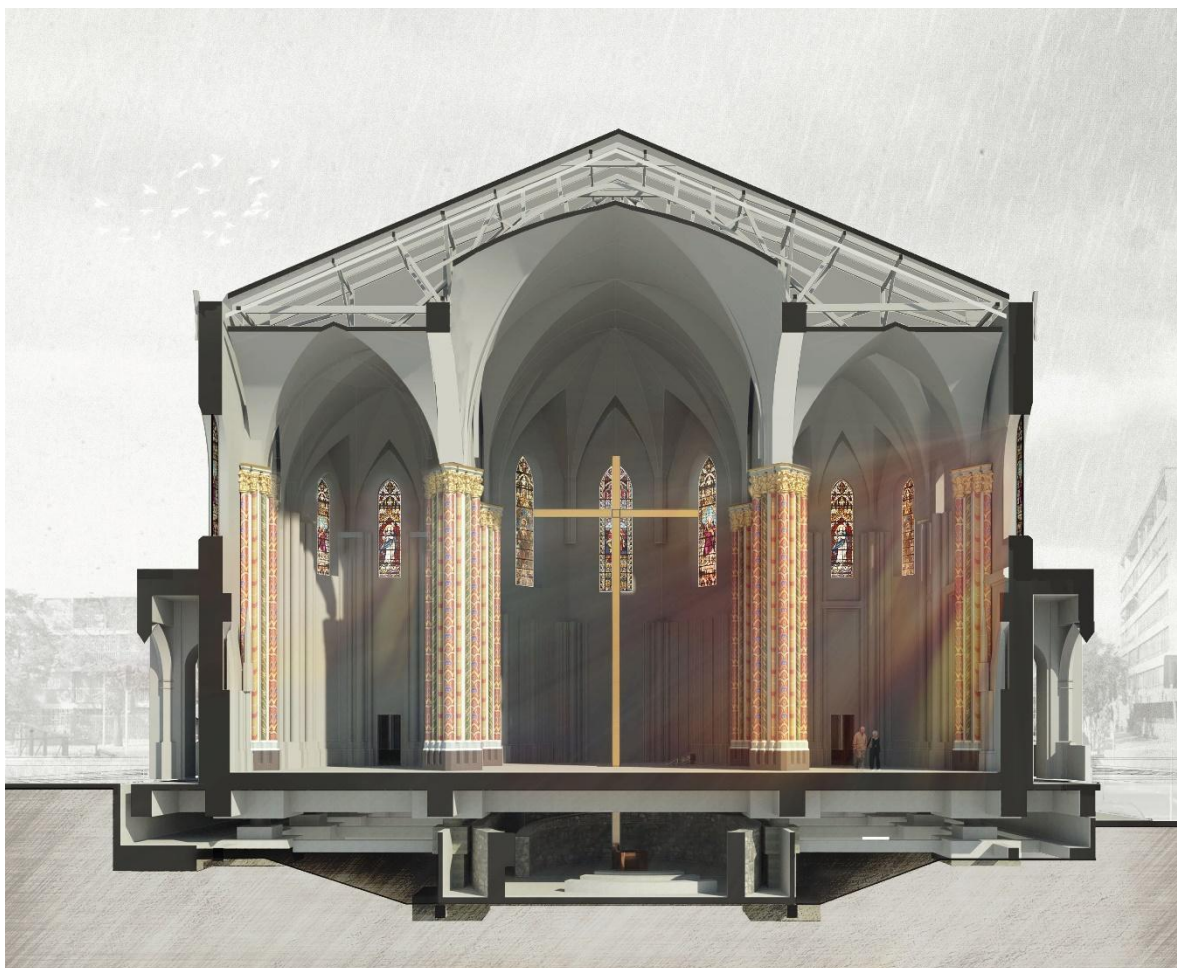

PROYECTO DE RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO
Anexo Bóvedas Albañilerías

RECONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS DE ALBAÑILERÍA | PROCESO CONSTRUCTIVO

1.-TRABAJOS PREVIOS

Se realizará una limpieza y saneamiento de los bordes de fractura para asegurar la correcta unión entre existente y reconstrucción, eliminando elementos sueltos y generando una superficie de unión endentada que garantice una buena traba.

Los bordes de unión se saturarán de agua previo a la ejecución de las nuevas faenas de albañilería. Se reconstruirán en primer lugar los arcos perimetrales y transversales hasta la altura de terminación según proyecto de arquitectura y según procedimientos de reconstrucción de arcos de albañilería

2.- CIMBRAS

Se dispondrán cimbras para el apoyo de la bóveda de albañilería durante su proceso de reconstrucción, las que se mantendrán hasta terminado el proceso reconstructivo y el fraguado de los elementos que lo componen.

Serán fabricadas en madera de pino insigne, formadas por costillas de altura variable ajustadas a la geometría del elemento a reconstruir, según levantamiento y tomando como referencia la geometría de elementos existentes. La superficie de apoyo de la albañilería será de tablero curvado clavado a las costillas de altura variable que definen las directrices curvas de las bóvedas.

Se apoyarán sobre alzaprimas con sistema de descarga controlada, ya sean mediante cuñas, o mediante sistema roscado que permita un retiro controlado.

3.- EJECUCIÓN DE BÓVEDA _ROSCA DE LADRILLO

Se ejecutará con ladrillo macizo del mismo formato que el existente, adaptándose a la geometría y aparejo de las bóvedas existentes y adyacentes a la reconstrucción. El ladrillo será saturado en agua previo a su instalación, se consideran llagas de 1,5cm de espesor de mortero mixto de cal, cemento puzolánico y arena en proporciones 1:1:6, si bien se realizarán dosificaciones a verificar en obra.

Se avanzará por roscas parejas desde los arranques hacia la clave de la bóveda, verificando en todo momento el trazado, aparejo y disposición de la albañilería.

Finalizada la bóveda, se aplicará por su cara superior una solución fluida de agua y cal que sature los poros, generando una costra de consolidación transpirable pero impermeable.

4.- EJECUCIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN

Se realizará, sobre la costra de consolidación de cal, una capa de compresión que asegure un reparto de cargas uniforme del relleno sobre la bóveda. Esta capa de compresión será de 4cm de mortero mixto cemento puzolánico, cal y arena en proporciones 1:1:6, dosificación a verificar en obra.

5.- RELLENO

Se realizará sobre la capa de compresión un relleno de hormigón mixto pobre, utilizando cascote de ladrillo procedente de demoliciones a realizar en el edificio como elemento desplazador. El relleno se realizará por capas de 30cm de espesor compactadas con apisonado manual, hasta alcanzar la cota de terminación según arquitectura, tomando especial atención en el correcto relleno del arranque y hasta los riñones de la bóveda. La mezcla del relleno tendrá las siguientes proporciones expresadas en volumen:

- a) 30% de cascote de ladrillo, formato irregular evitando formas cuadradas o rectangulares, privilegiando formas sensiblemente poligonales y próximas a piramidales de base triangular. Tamaño aproximado envolvente de cada pieza 15x15x6cm.
- b) 34% agregado pétro, de grava y arena bajo 19mm. 2 partes de grava (19-12.5mm), 2 partes de gravilla (12.5-4.75mm) y 1 parte de arena (<4.75mm).
- c) 16% de mezcla de cemento puzolánico y cal en proporción 2:1.
- d) 20% de agua libre.

Los materiales desplazadores y agregados se consideran en estado saturado superficialmente seco. La dosificación se verificará y ajustará en obra.

6.- TERMINACIÓN SUPERIOR

Sobre el relleno se dispondrá un polietileno y una terminación tipo sobre losa de hormigón armado impermeabilizada superficialmente con pendiente hacia el exterior.



FRANCISCO PRADO G.
Constructor Civil



PROPIETARIO



DINO BOZZI F.
Arquitecto
